ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

За СМР за обект:“Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ –Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7”.

Поз. От ПСД	Наименование	ед. Мярка	количество	ч.ч. за ед мярка	ч.ч общо	продължи-телност човекодни	трудов ресурс човека	продължи-телност дни
1	Корекции по стени и тавани на работни помещения и коридори с фини гипсови шпакловачни смеси - 10%	м2	899.19	0.500	450	56.20	2	28.100
12	Разместване на мебели и оборудване, опаковане с полиетиленово фолио и почистване след ремонта.	100м2	32.76	5.896	193	24.14	2	12.072
2	Грундиране на стени и тавани на работни помещения и коридори с дълбокопроникващ контактен грунд - 30%	м2	2840.45	0.160	454	56.81	10	5.681
3	Двукратно боядисване на стени и тавани на работни помещения и коридори с бял латекс	м2	8783.06	0.376	3302	412.80	10	41.280
7	Направа на декоративна надлъжна ивица (ширина 30см) по коридори и фоайета с цветен латекс	м	375.44	0.269	101	12.62	10	1.262
4	Корекции по стени и тавани (дъна на стълбищни рамена и площадки) на стълбища с фини гипсови шпакловачни смеси - средно 10%	м2	59.08	0.500	30	3.69	2	1.846
5	Грундиране на стени и тавани (дъна на стълбищни рамена и площадки) на стълбища с дълбокопроникващ грунд - 30%	м2	177.24	0.160	28	3.54	10	0.354
6	Двукратно боядисване на стени и тавани (дъна на стълбищни рамена и площадки) на стълбища с бял латекс	м2	590.81	0.376	222	27.77	10	2.777
8	Абразивно почистване и награпяване на стени със съществуващо покритие от венецианска мазилка	м2	208.89	0.081	17	2.12	6	0.353
9	Двукратно боядисване на стени (до 2,10м от съществуващ под) на фоайе, коридори и стълбище на кота +/-0.00 с цветен латекс	м2	208.89	0.392	82	10.24	6	1.706
10	Подмяна на плаки (ламели) за растерен окачен таван върху съществуваща растерна конструкция - 100%	м2	832.05	0.221	184	22.99	4	5.746
11	Доставка и монтаж на охранителни ивици по стени на фоайе и коридори на кота +/-0,00 (ансамбъл от 2 броя кантовани дъски от цветни ПДЧ плоскости 18мм с ширина 0,15м, монтирани една над друга)	м	99.16	0.850	84	10.54	4	2.634
13	Демонтаж на алумунуева дограма (прозорци) със запазване и пренос до склад на възложителя	м2	2.52	2.526	6	0.80	2	0.398
14	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 120/130см с двуосно отваряне и 100% отваряема площ	бр	1	4.368	4	0.55	2	0.273
15	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 59/162см с двуосно отваряне и 100% отваряема площ	бр	1	2.740	3	0.34	2	0.171
16	Изграждане на система за подгряване на барбакани против обледяване и сняг	к-т	1	40.000	40	5.00	3	1.667
						общ брой работници		

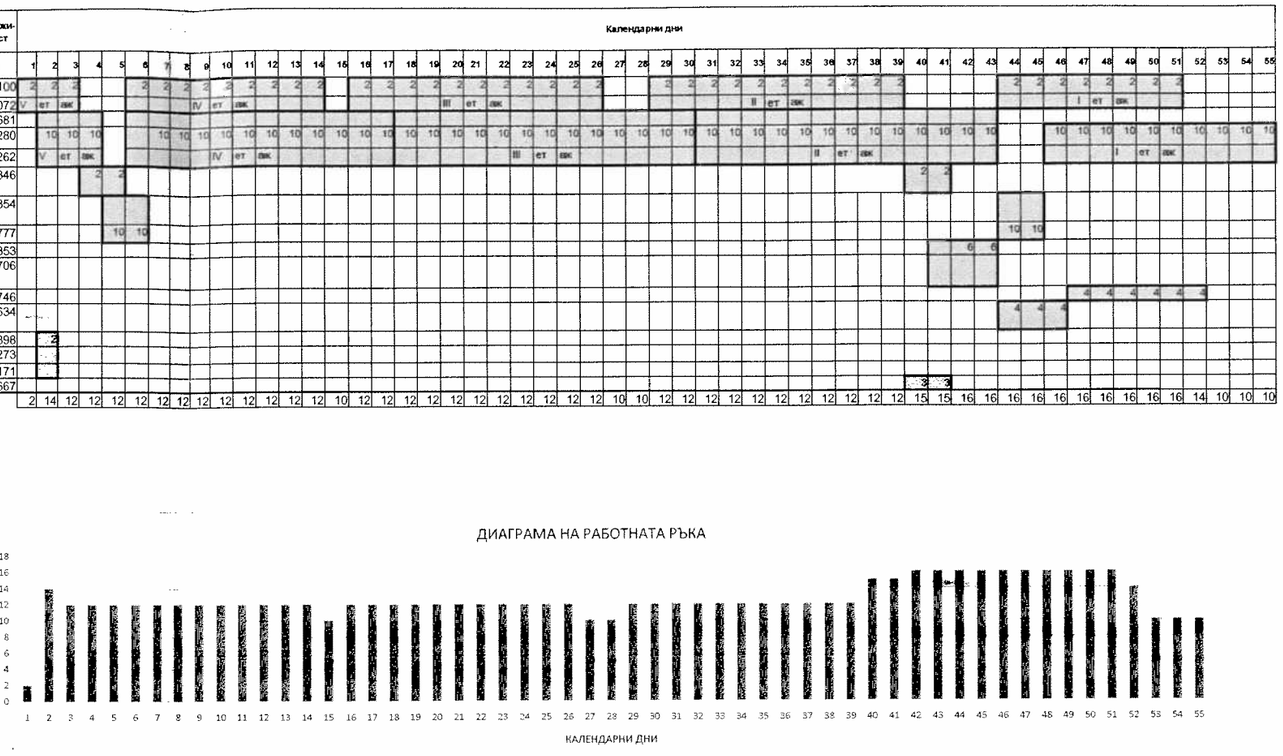

10.08.2015 г.

Управител на "Радиант и Ко" ООД:

(инж. Мартин Митев)

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА
