

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	September			November	
					B	E	M	B	E
1	НАЧАЛО НА ПРОЕКТА	523 days	Mon 3.10.16	Wed 3.10.18					
2	Планиран край на дейност 1	0 days	Wed 6.9.17	Wed 6.9.17					
3	Дейност 1: Доставка и инсталиране на хардуер и софтуер в НАП	372 days?	Tue 4.10.16	Wed 7.3.18					
36	Планиран край на дейност 2	0 days	Mon 10.9.18	Mon 10.9.18					
37	Дейност 2: Внедрявана на национална точка за достъп (НТД) и RINA в НАП, АСП, НЗОК	442 days	Mon 3.10.16	Tue 12.6.18					
110	Планиран край на дейност 3	0 days	Tue 10.7.18	Tue 10.7.18					
111	Дейност 3: Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между НТД в НАП, АСП, НЗОК, НОИ	465,88 days	Mon 6.3.17	Mon 17.12.18					
112	Осигуряване на обмен на информация от/към НАП и другите НД	208 days	Tue 27.2.18	Thu 13.12.18					
131	Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между НТД в АСП	221 days	Wed 7.2.18	Wed 12.12.18					
148	Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между НТД в НЗОК	229 days	Wed 31.1.18	Mon 17.12.18					
165	Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между НТД в НОИ	423 days	Mon 6.3.17	Thu 18.10.18					
166	Изготвяне на техническо задание	70 days	Tue 23.5.17	Mon 28.8.17					
167	Съгласуване на техническото описание в ДАЕУ	14 days	Tue 29.8.17	Fri 15.9.17					
168	Изготвяне и съгласуване на докладна	14 days	Mon 18.9.17	Thu 5.10.17					
169	Вътрешен индикатор: Утвърдена докладна	0 days	Thu 5.10.17	Thu 5.10.17					
170	Избор на изпълнител за НОИ по Дейности 3, 6 и 7	78 days	Mon 9.10.17	Thu 25.1.18					
171	Изготвяне и съгласуване на документация	14 days	Mon 9.10.17	Fri 27.10.17					
172	Предварителен контрол на АОП	3 days	Fri 27.10.17	Wed 1.11.17					
173	Вътрешен индикатор: Публикуване на решение и обявление :	0 days	Wed 1.11.17	Wed 1.11.17					

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	September			November	
					B	E	M	B	E
174	Подаване на оферти от фирмите	25 days	Wed 1.11.17	Wed 6.12.17					
175	Вътрешен индикатор: Отваряне на оферти от комисията за о	0 days	Tue 5.12.17	Tue 5.12.17					
176	Работа на комисия	20 days	Thu 7.12.17	Thu 4.1.18					
177	Издаване на решение за определяне на изпълнител	5 days	Thu 4.1.18	Thu 11.1.18					
178	Вътрешен индикатор: Изтекъл срок за обжалване - решението	0 days	Wed 10.1.18	Wed 10.1.18					
179	Сключване на договор с изпълнител	10 days	Thu 11.1.18	Thu 25.1.18					
180	Вътрешен индикатор: Сключен договор с изпълнител	0 days	Thu 25.1.18	Thu 25.1.18					
181	Фаза 1 Анализ	30 days	Thu 25.1.18	Thu 8.3.18					
182	Анализ на необходимите данни за НОИ от другите НДТ	20 days	Thu 25.1.18	Thu 22.2.18					
183	Анализ на необходимите данни за НДТ от НОИ	20 days	Thu 25.1.18	Thu 22.2.18					
184	Изготвяне на детайлен архитектурен модел на обмена на дан	5 days	Thu 22.2.18	Thu 1.3.18					
185	Преглед и одобрение на моделите от останалите НДТ	5 days	Thu 1.3.18	Thu 8.3.18					
186	Фаза 2 Разработка	100 days	Wed 7.3.18	Wed 25.7.18					
187	Разработка на техногична среда за обмен на информация ме	100 days	Thu 8.3.18	Thu 26.7.18					
188	Разработка на необходимите сървиси за обмен на информац	100 days	Thu 8.3.18	Thu 26.7.18					
189	Инсталирана среда за обмен и всички сървиси за обмен на и	0 days	Wed 25.7.18	Wed 25.7.18					
190	Фаза 3 Тестове и приемане	60 days	Thu 26.7.18	Thu 18.10.18					
191	Тест на средата	20 days	Thu 26.7.18	Thu 23.8.18					
192	Прием на средата	20 days	Thu 23.8.18	Thu 20.9.18					
193	Тест на обмена на данни във всички НДТ	10 days	Thu 20.9.18	Thu 4.10.18					
194	Прием на хоризонталния обмен на данни	10 days	Thu 4.10.18	Thu 18.10.18					
195	Фаза 4 Обучение	3 days	Wed 3.10.18	Mon 8.10.18					
196		3 days	Wed 3.10.18	Mon 8.10.18					

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
Date: Wed 18.10.17

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	September			November	
					B	E	M	B	E
197	Обучение на 5 ИТ експерти на НОИ /за администриране/	3 days	Tue 9.10.18	Fri 12.10.18					
198	Индикатор 3: ИТД и RINA тествани и приети при всички административни	0 days	Tue 10.7.18	Tue 10.7.18					
199	Индикатор 1: Избрани изпълнители за всички дейности	0 days	Mon 5.6.17	Mon 5.6.17					
200	Дейност 4: Координация и управление на проекта от страна на НАП		Mon 3.10.16						
201	Изготвяне на тримесечни отчети за състоянието на проекта	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
202	Подготовка на заседание на Надзорен съвет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
203	Изготвяне на технически доклад	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
204	Изготвяне на финансов отчет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
205	Индикатор 5: Годишен доклад 2017 изготвен и представен на бенефициерите	0 days	Fri 29.12.17	Fri 29.12.17					
206	Индикатор 6: Окончателен доклад и финасов отчет представени	0 days	Wed 3.10.18	Wed 3.10.18					
207	Планиран край на дейност 5	1 day?	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
208	Дейност 5: Разработване на модул за управление на данните за зареждане в СЕД /в НЗОК/	251 days	Wed 31.1.18	Wed 16.1.19					
221	Индикатор 7: Изготвена документация с дизайн на системата за управление на данните за СЕД	0 days	Wed 21.6.17	Wed 21.6.17					
222	Индикатор 8: Системата за управление на данните за СЕД инсталирана, тествана и приета	0 days	Tue 26.6.18	Tue 26.6.18					
223	Планиран край на дейност 6	533,94 days	Mon 3.10.16	Thu 18.10.18					
224	Дейност 6: Внедряване на софтуерни модули за интеграция между националното приложение на НОИ и ИТД/RINA	423 days	Mon 6.3.17	Thu 18.10.18					
225	Фаза 1 Анализ	30 days	Thu 25.1.18	Thu 8.3.18					
226	Анализ на BUCs/SEDs, базирани на Ver.4.0	20 days	Thu 25.1.18	Thu 22.2.18					
227	Анализ на Architecture pack 1.0	20 days	Thu 25.1.18	Thu 22.2.18					

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	September			November	
					B	E	M	B	E
228	Изготвяне на детайлен архитектурен модел за свързване	10 days	Thu 22.2.18	Thu 8.3.18					
229	Фаза 2 Разработка	100 days	Wed 7.3.18	Wed 25.7.18					
230	Разработка на техногична среда за свързване към RINA/AP	50 days	Wed 7.3.18	Wed 16.5.18					
231	Разработка на необходимите модули за свързване	50 days	Wed 16.5.18	Wed 25.7.18					
232	Вътрешен индикатор: Инсталирана среда за свързване на националното приложение	0 days	Wed 25.7.18	Wed 25.7.18					
233	Фаза 3 Тестове и приемане	60 days	Thu 26.7.18	Thu 18.10.18					
234	Тест на средата	20 days	Thu 26.7.18	Thu 23.8.18					
235	Прием на средата	20 days	Thu 23.8.18	Thu 20.9.18					
236	Прием на модула за обмен	20 days	Thu 20.9.18	Thu 18.10.18					
237	Фаза 4 Обучение	6 days	Wed 10.10.18	Thu 18.10.18					
238	Обучение на 2 ИТ експерти на НОИ /за разработка/	3 days	Wed 10.10.18	Mon 15.10.18					
239	Обучение на 4 ИТ експерти на НОИ /за администриране/	3 days	Mon 15.10.18	Thu 18.10.18					
240	Планиран край на дейност 7	534,06 days	Mon 3.10.16	Thu 18.10.18					
241	Дейност 7: Надграждане на модулите на НОИ за съхранение на СЕД/НЕД и за управление на правата за достъп	423 days	Mon 6.3.17	Thu 18.10.18					
242	Фаза 1 Анализ	30 days	Thu 25.1.18	Thu 8.3.18					
243	Анализ на BUK/SED , XML/XSD 4.0 и необходимите данни за НОИ от другите за захранване на СЕД	20 days	Thu 25.1.18	Thu 22.2.18					
244	Анализ на необходимите данни за SED ver 4.0	20 days	Thu 25.1.18	Thu 22.2.18					
245	Изготвяне на детайлен архитектурен модел на решението	10 days	Thu 22.2.18	Thu 8.3.18					
246	Фаза 2 Разработка	100 days	Thu 8.3.18	Thu 26.7.18					
247	Разработка на техногична среда за работа на EESSI системата на	50 days	Thu 8.3.18	Thu 17.5.18					


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	September			November	
					B	E	M	B	E
248	Разработка на необходимите услуги(SOA) за обмен на информация от/към НОИ	50 days	Thu 17.5.18	Thu 26.7.18					
249	Инсталирана среда за обмен и всички услуги за обмен на информация във всички НДТ	0 days	Thu 26.7.18	Thu 26.7.18					
250	Фаза 3 Тестове и приемане дейност 6 и 7	60 days	Thu 26.7.18	Thu 18.10.18					
251	ПЪЛЕН Тест на средата	20 days	Thu 26.7.18	Thu 23.8.18					
252	Прием на средата	7 days	Fri 24.8.18	Tue 4.9.18					
253	Тест на обмена на данни	20 days	Tue 4.9.18	Tue 2.10.18					
254	Прием на модернизиранията и разширена среда	12 days	Tue 2.10.18	Thu 18.10.18					
255	Фаза 4 Обучение	6 days	Mon 1.10.18	Tue 9.10.18					
256	Обучение на 5 ИТ експерти на НОИ /за разработка/ специализирани обучения	5 days	Mon 1.10.18	Fri 5.10.18					
257	Обучение на 5 ИТ експерти на НОИ /за администриране/ специализирани обучения	4,94 days	Mon 8.10.18	Fri 12.10.18					
258	Обучение на 10 експерти за обучение на персонала, който ще работи с EESSI	3 days	Mon 15.10.18	Thu 18.10.18					
259	Индикатор 9: Софтуерът за НОИ разработен и инсталиран	0 days	Mon 9.4.18	Mon 9.4.18					
260	Индикатор 10: Приключени обучения за ИТ специалисти и потребители във всички администрации	0 days	Tue 10.7.18	Tue 10.7.18					
261	Индикатор 11: EESSI системата на България е преминала тестове за съвместимост с основната EESSI платформа / или друга организация за тестване на съвместимост/	0 days	Mon 10.9.18	Mon 10.9.18					
262	Дейност 8: Вътрешна координация на дейностите по проекта в АСП, НЗОК, НОИ	1 day?	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	September			November	
					B	E	M	B	E
263	Вътрешна координация в АСП	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
264	Изготвяне на тримесечни отчети за състоянието на проекта	392 days	Fri 10.3.17	Tue 11.9.18					
272	Подготовка на заседание на Надзорен съвет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
273	Изготвяне на технически доклад	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
274	Изготвяне на финансов отчет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
275	Вътрешна координация в НЗОК	1 day?	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
276	Изготвяне на тримесечни отчети за състоянието на проекта	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
277	Подготовка на заседание на Надзорен съвет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
278	Изготвяне на технически доклад	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
279	Изготвяне на финансов отчет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
280	Вътрешна координация в НОИ	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
281	Изготвяне на тримесечни отчети за състоянието на проекта	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
282	Подготовка на заседание на Надзорен съвет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
283	Изготвяне на технически доклад	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					
284	Изготвяне на финансов отчет	1 day	Mon 3.10.16	Mon 3.10.16					

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

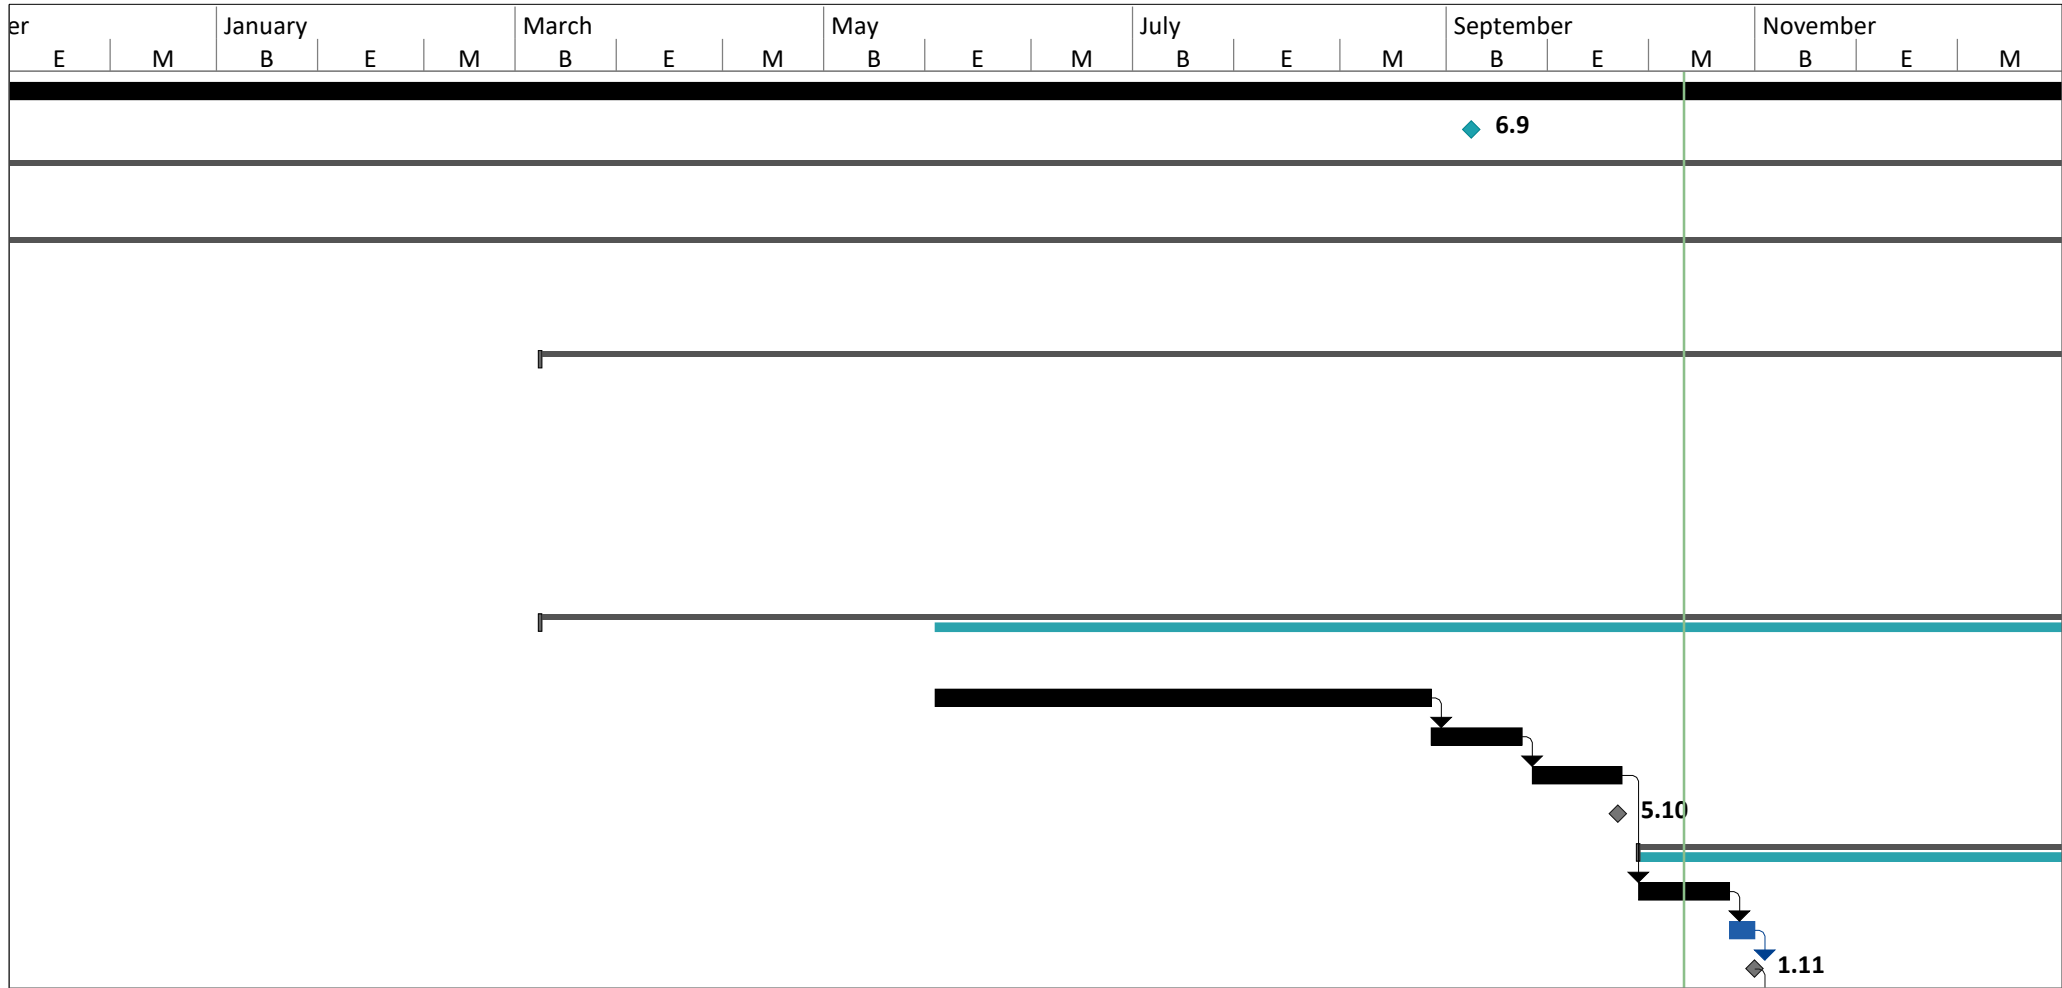


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
Date: Wed 18.10.17

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

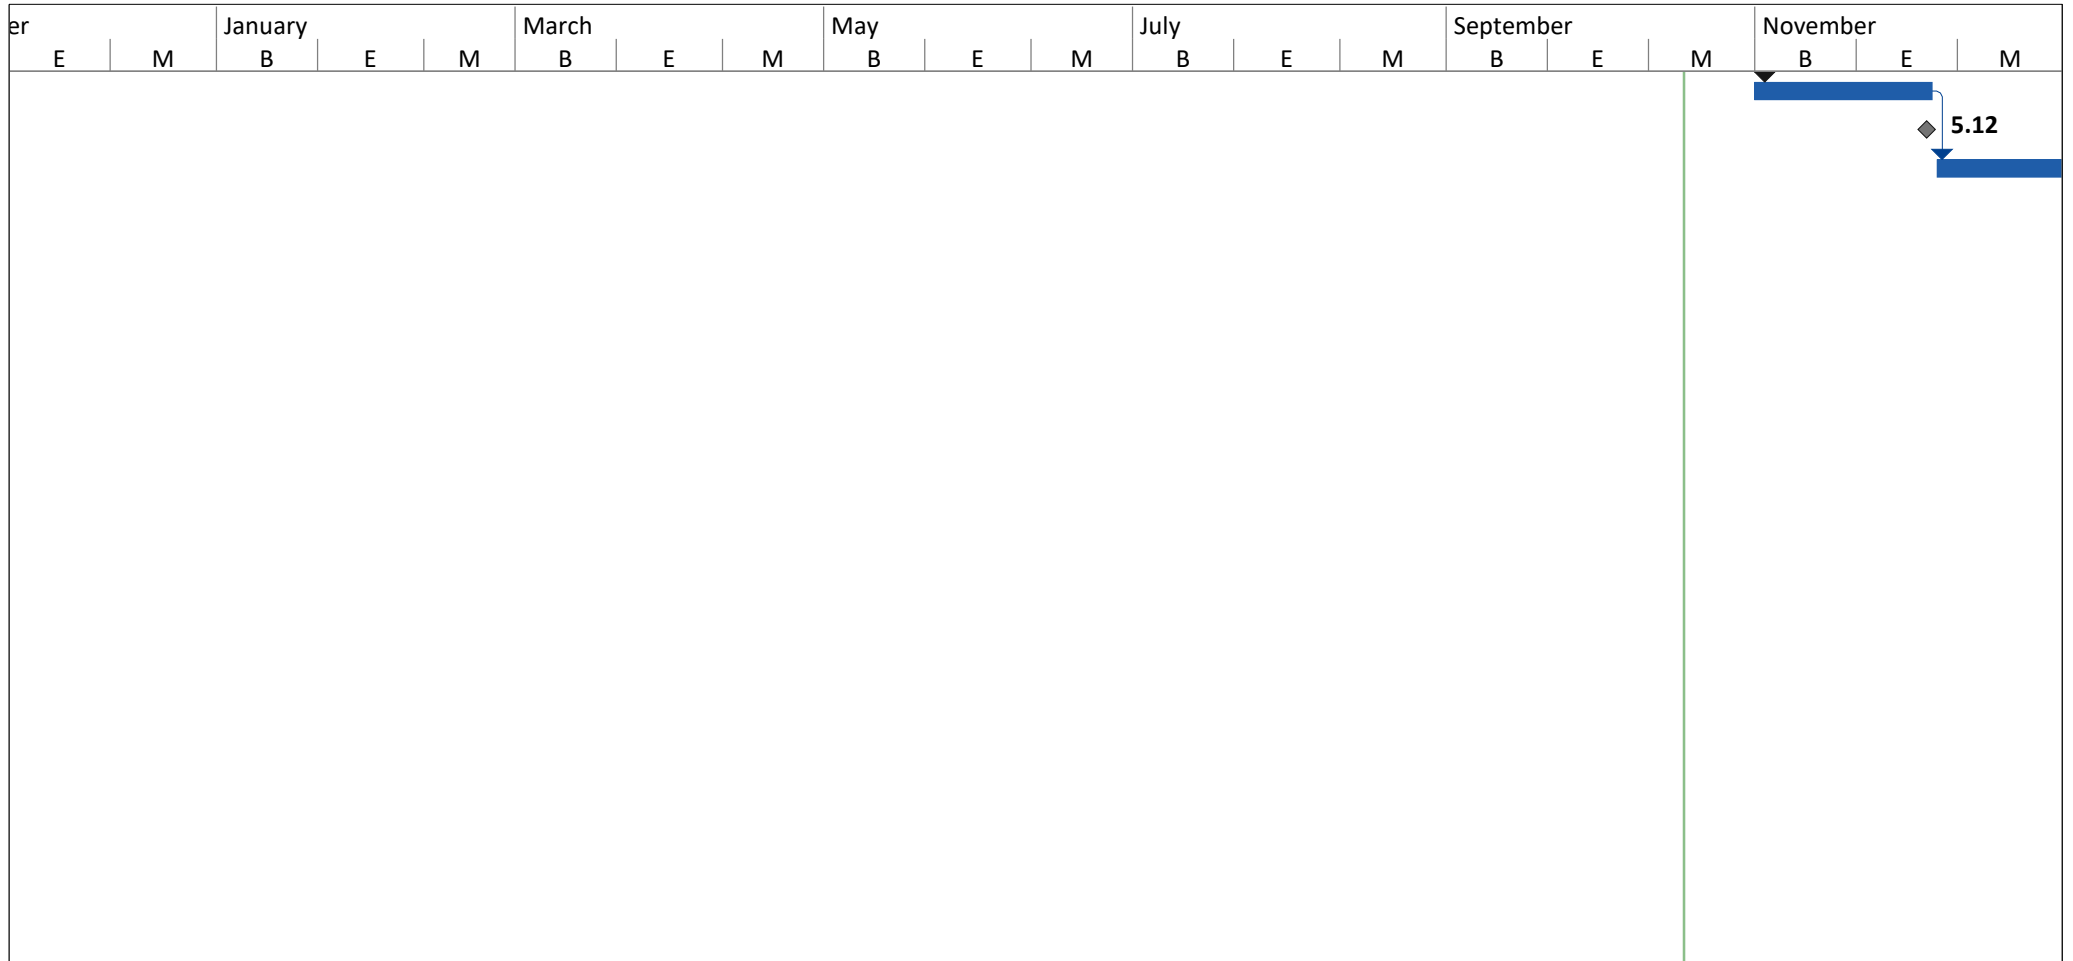


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
 Date: Wed 18.10.17


Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

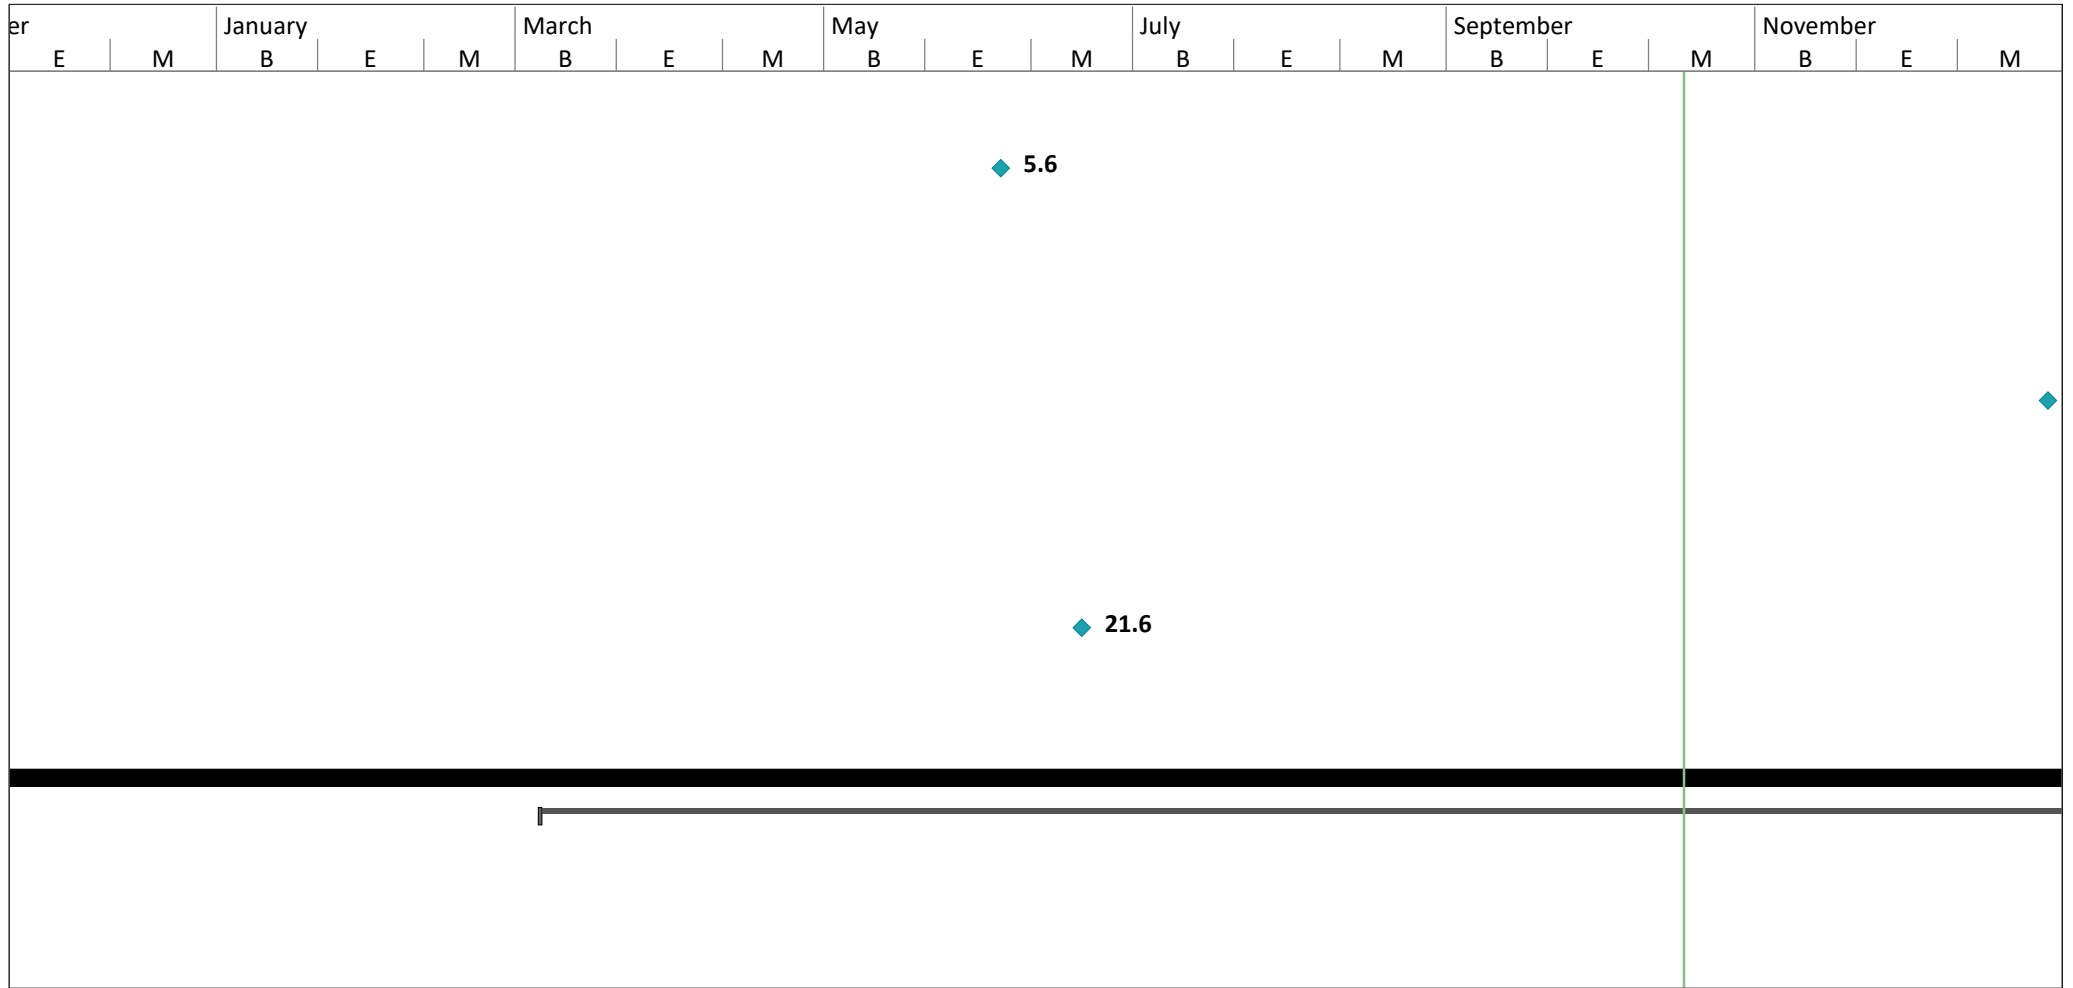


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

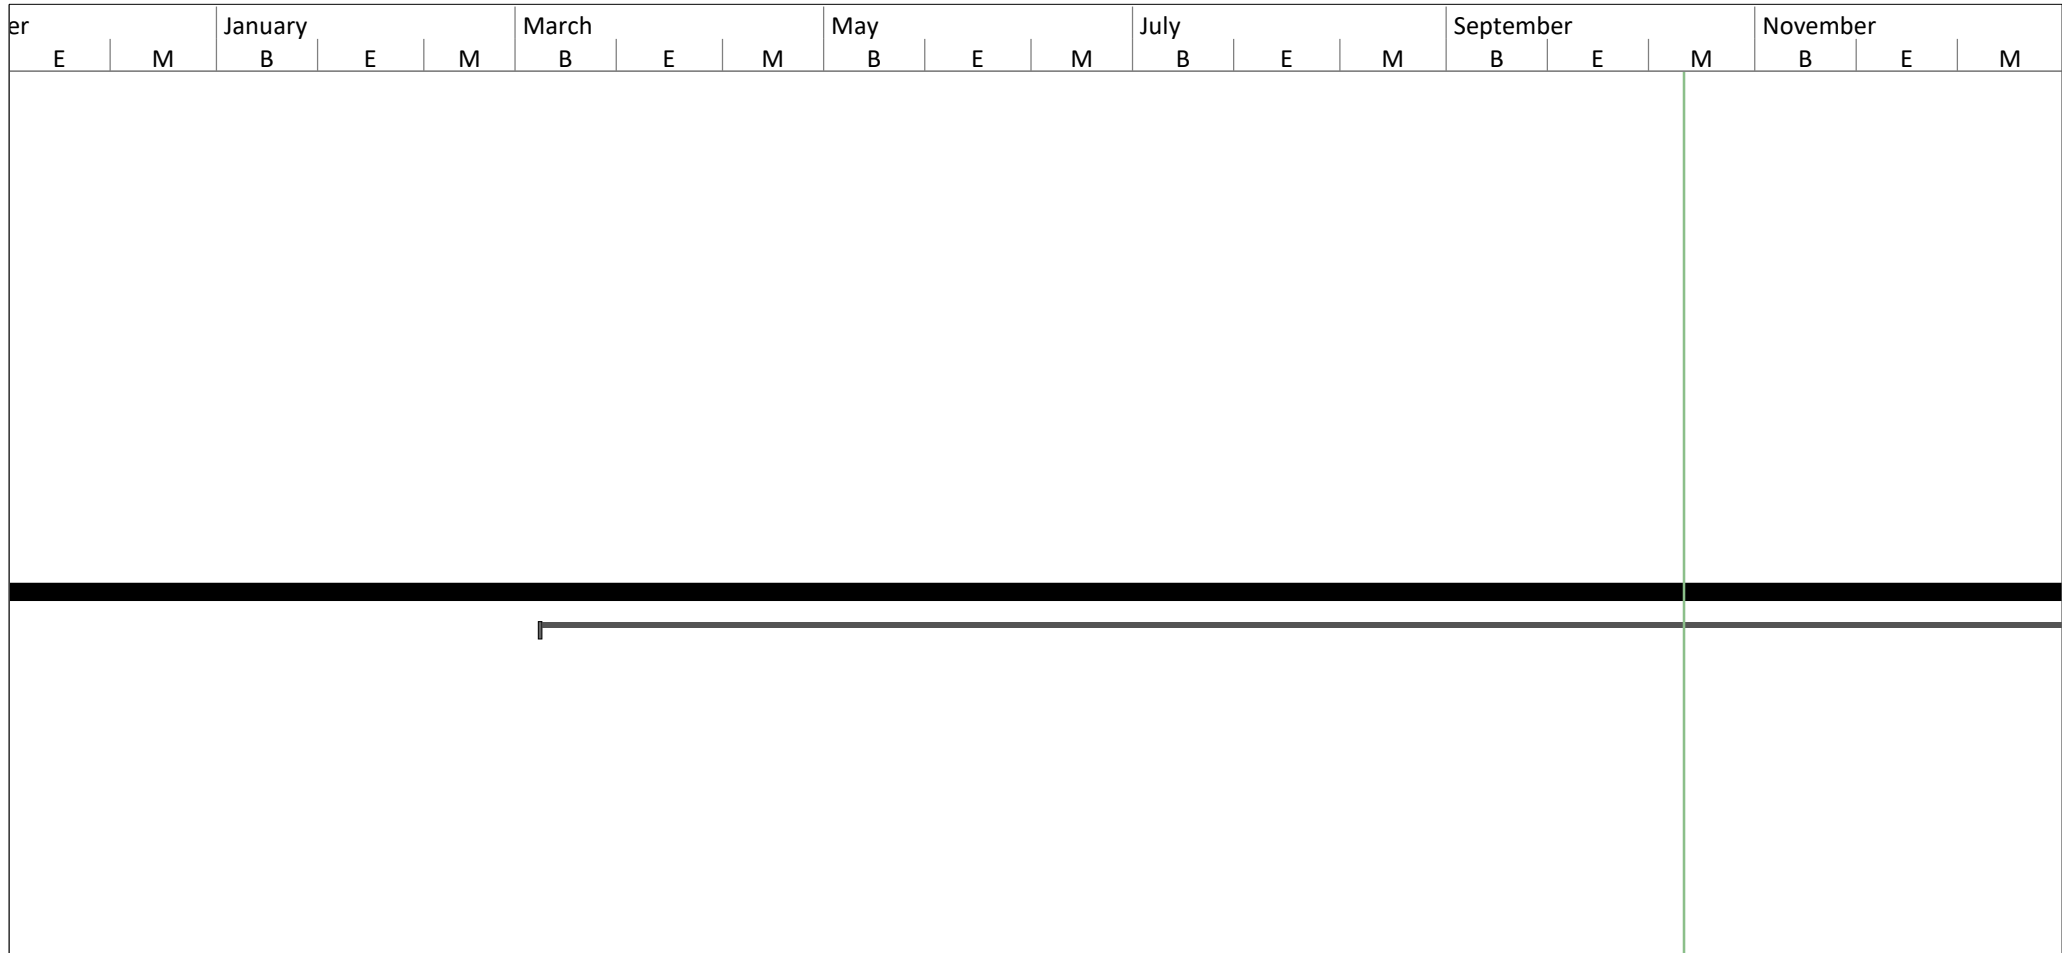

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			




Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

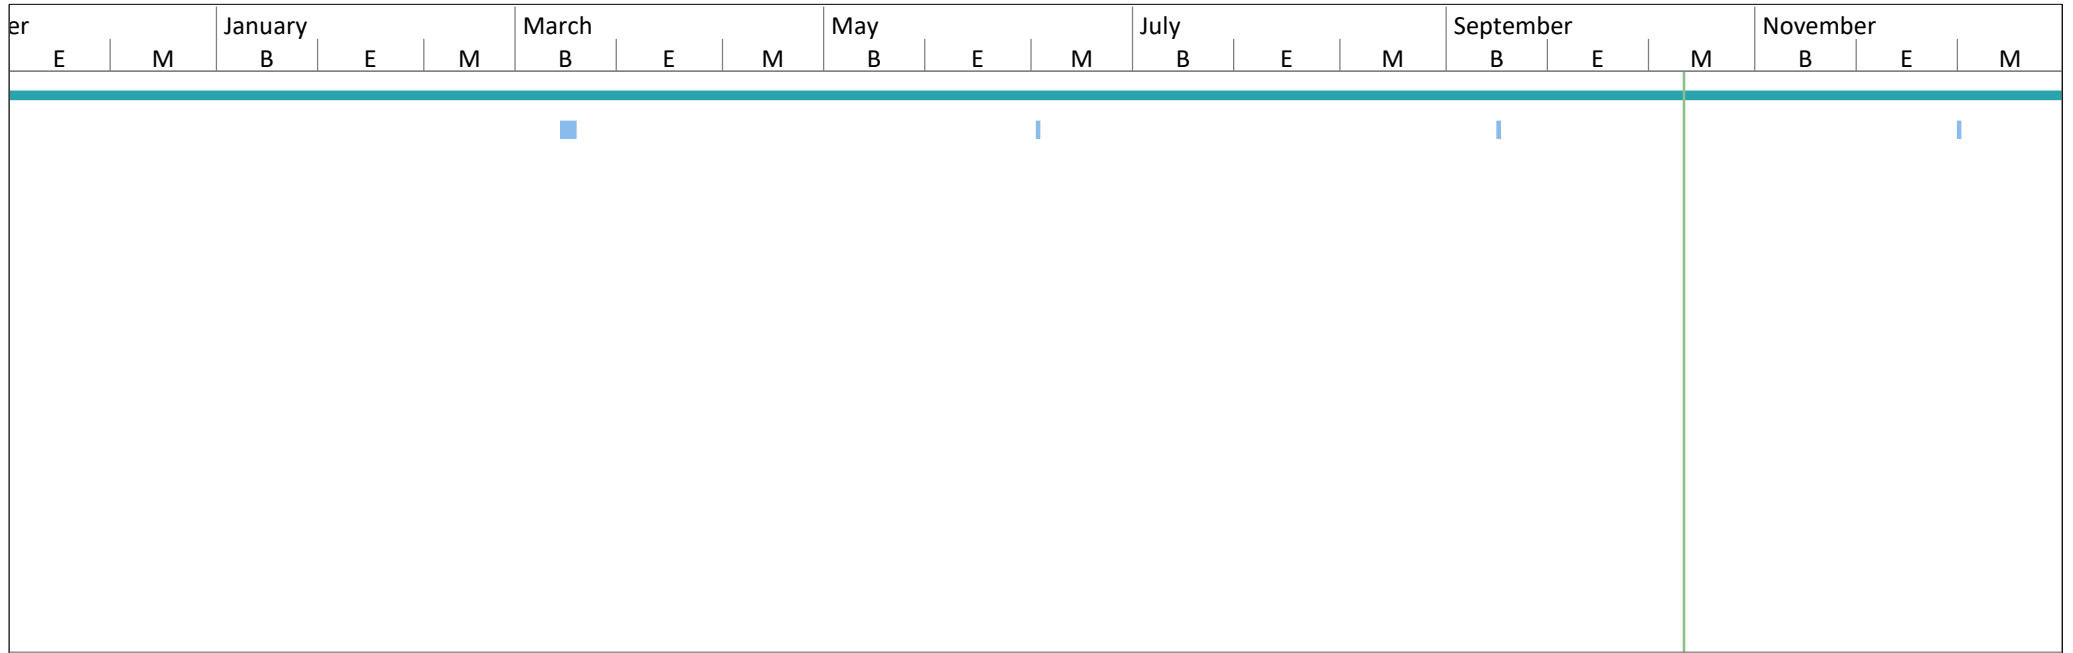


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
 Date: Wed 18.10.17

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

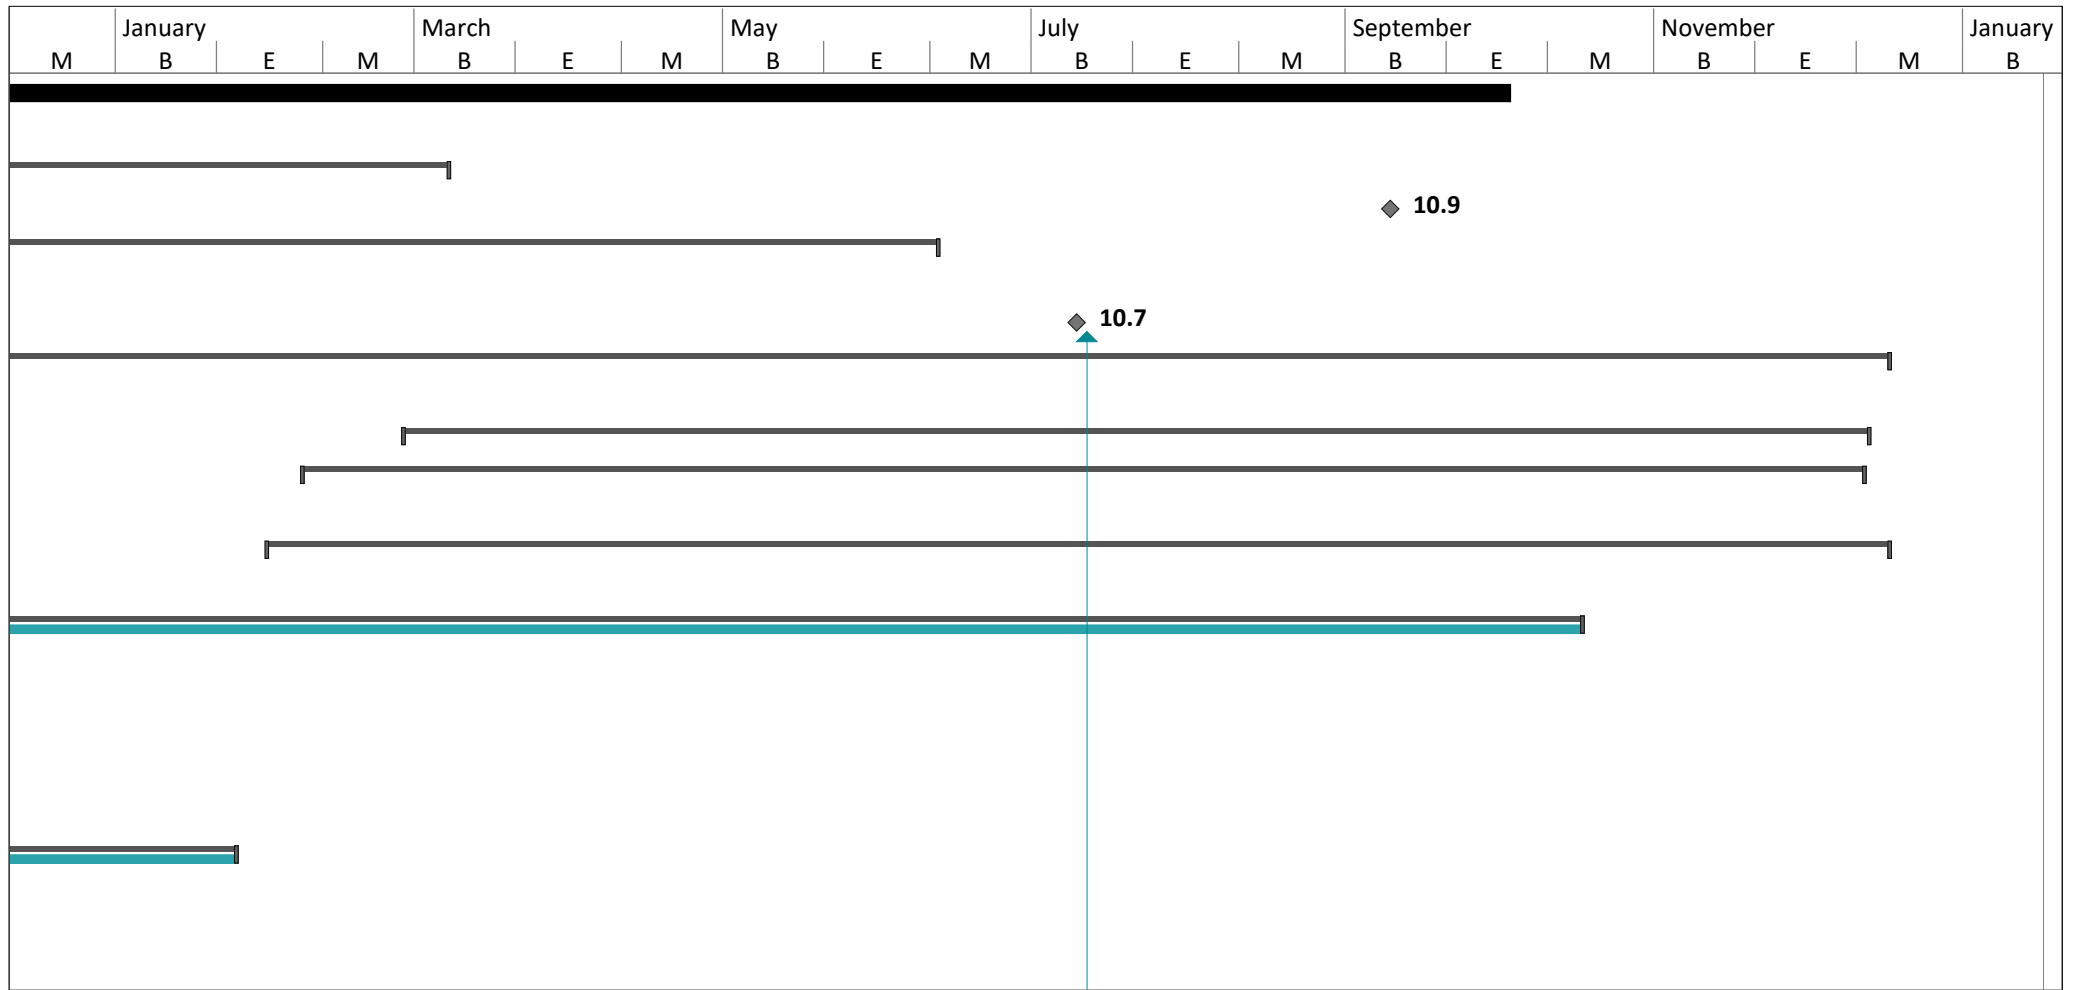


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary				

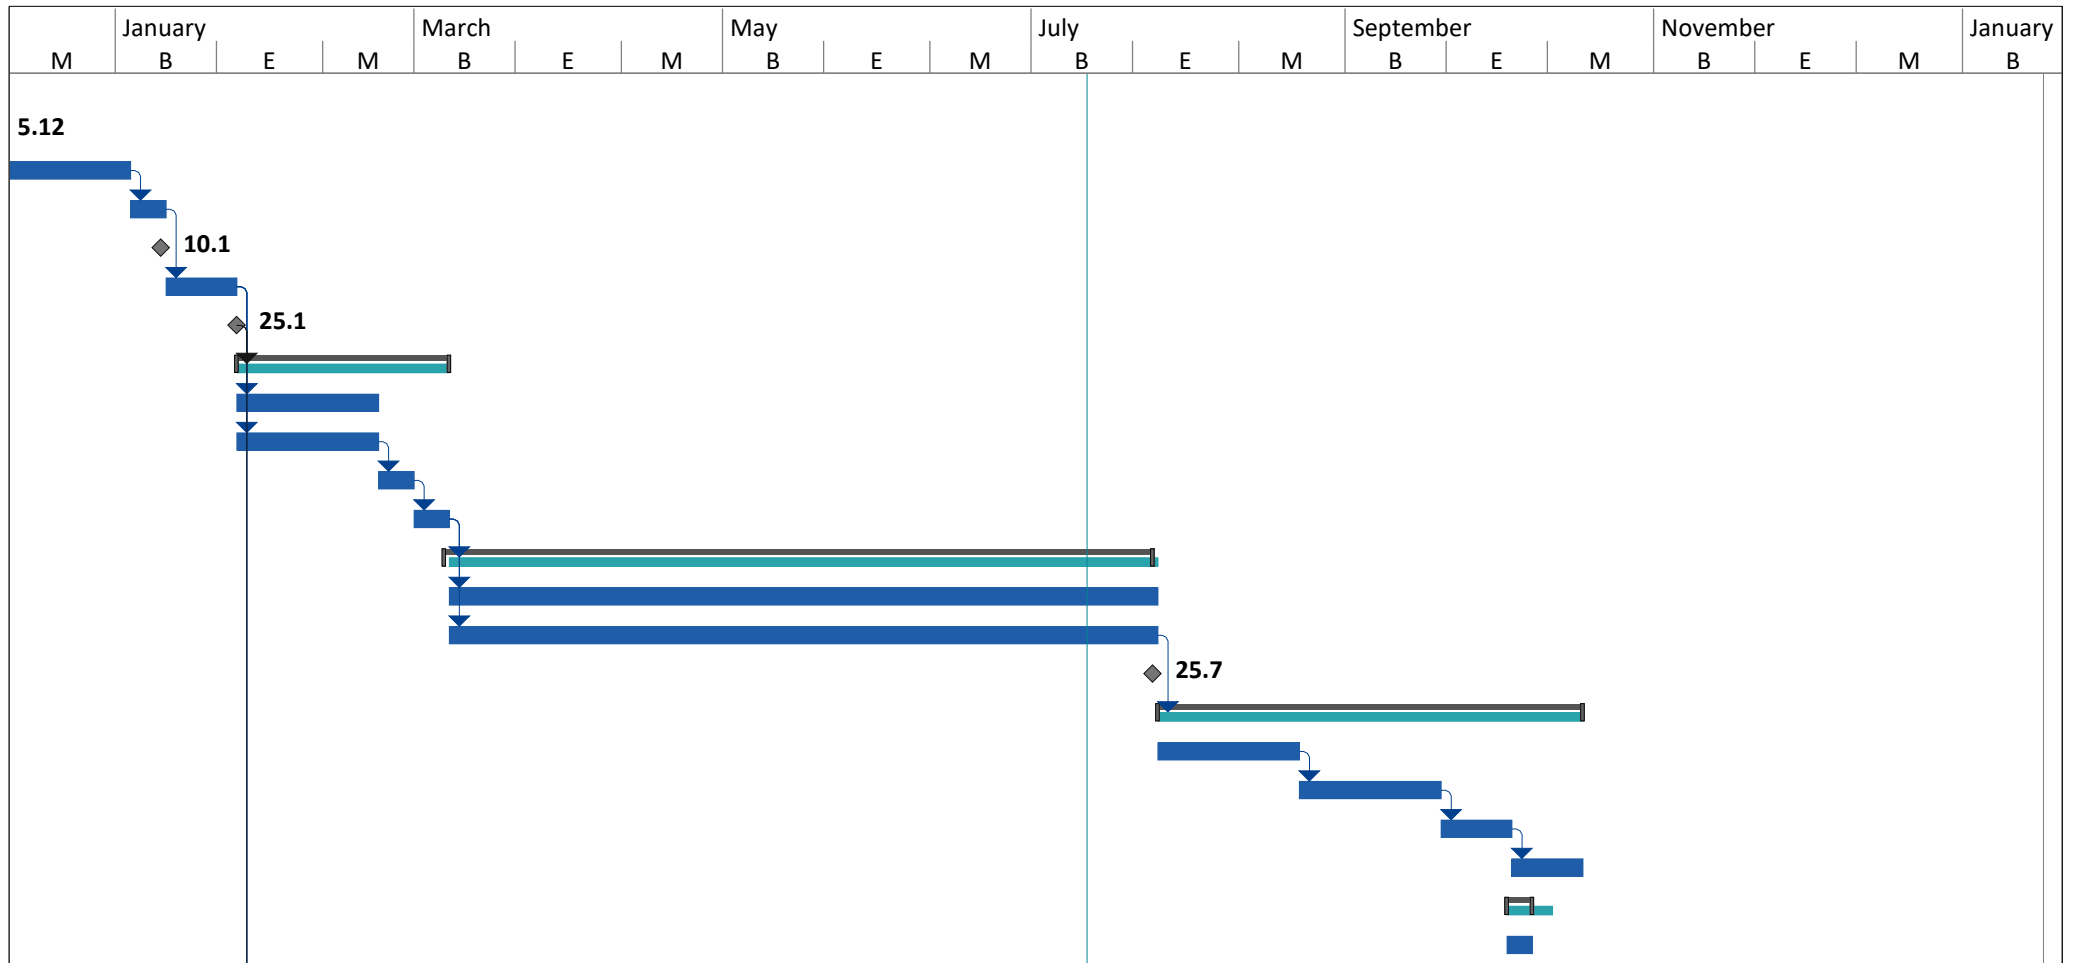


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
Date: Wed 18.10.17

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

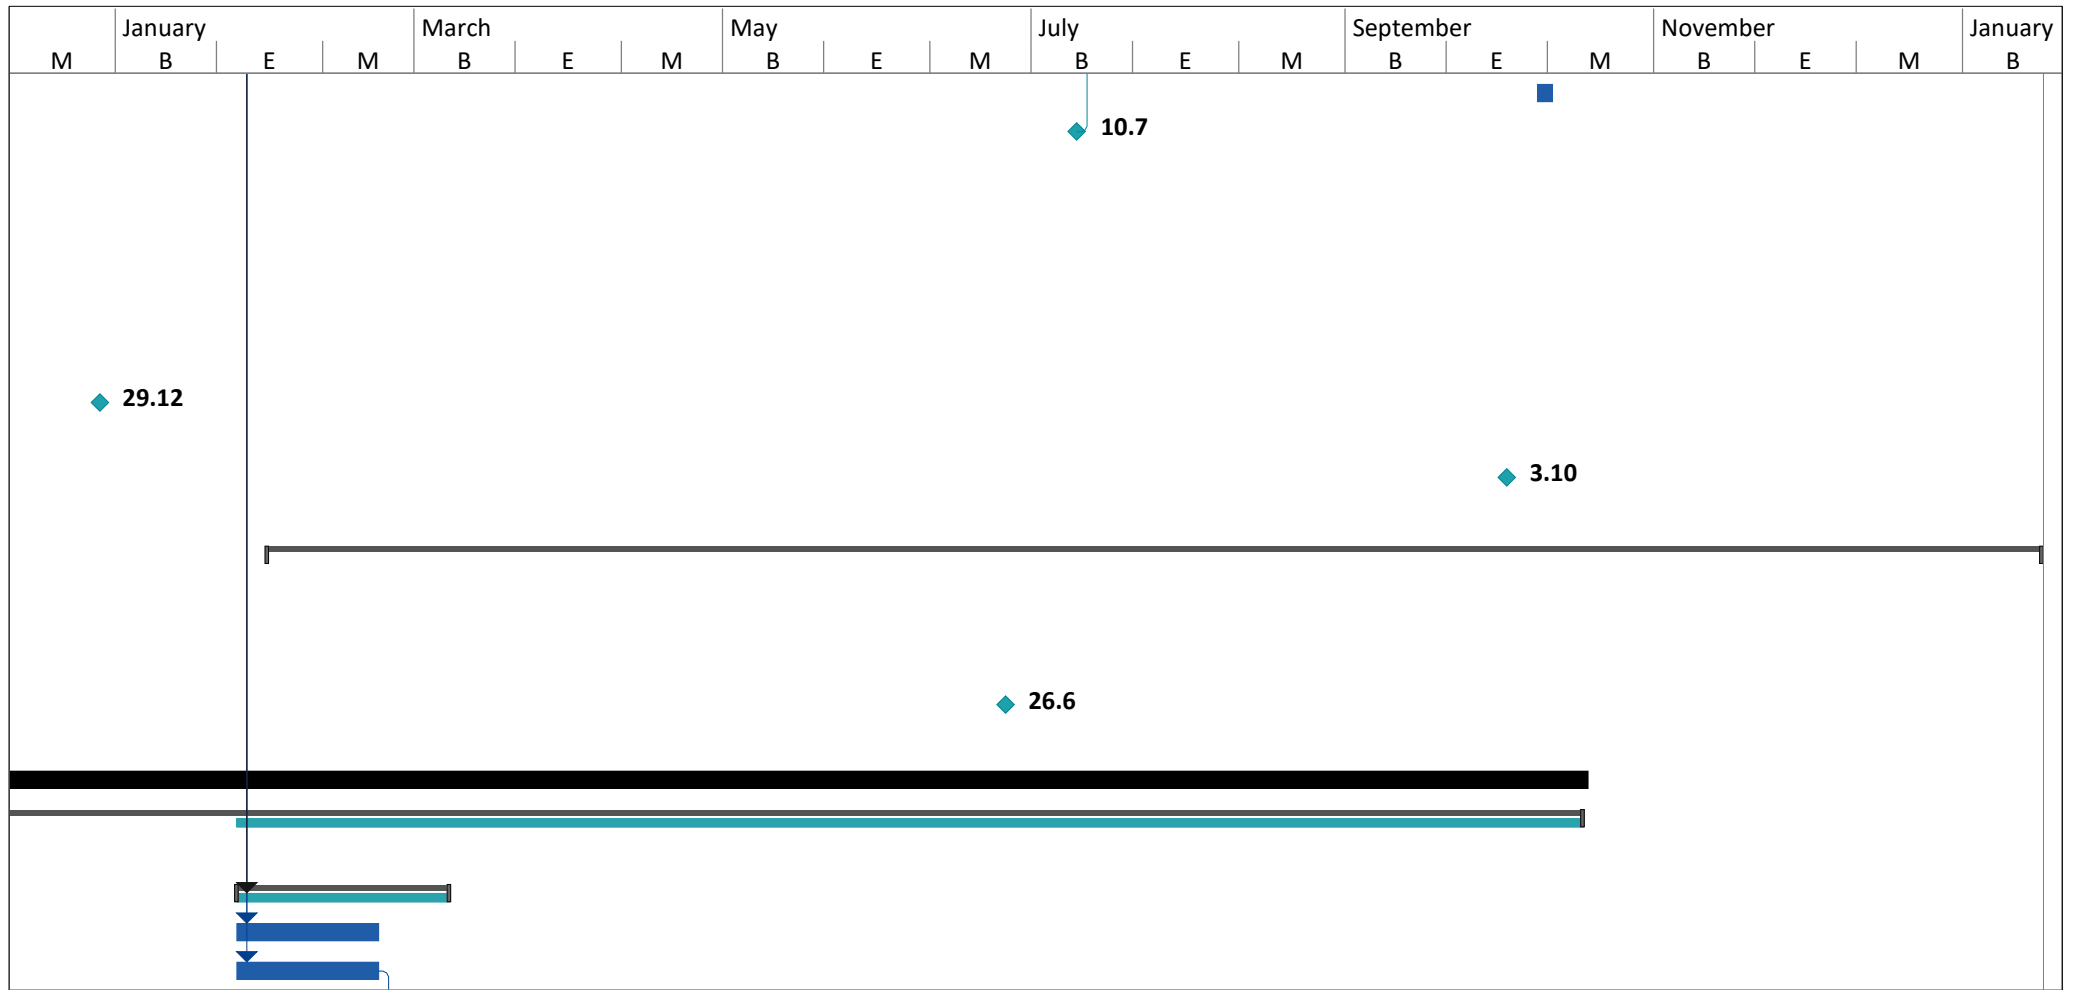


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
Date: Wed 18.10.17



Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

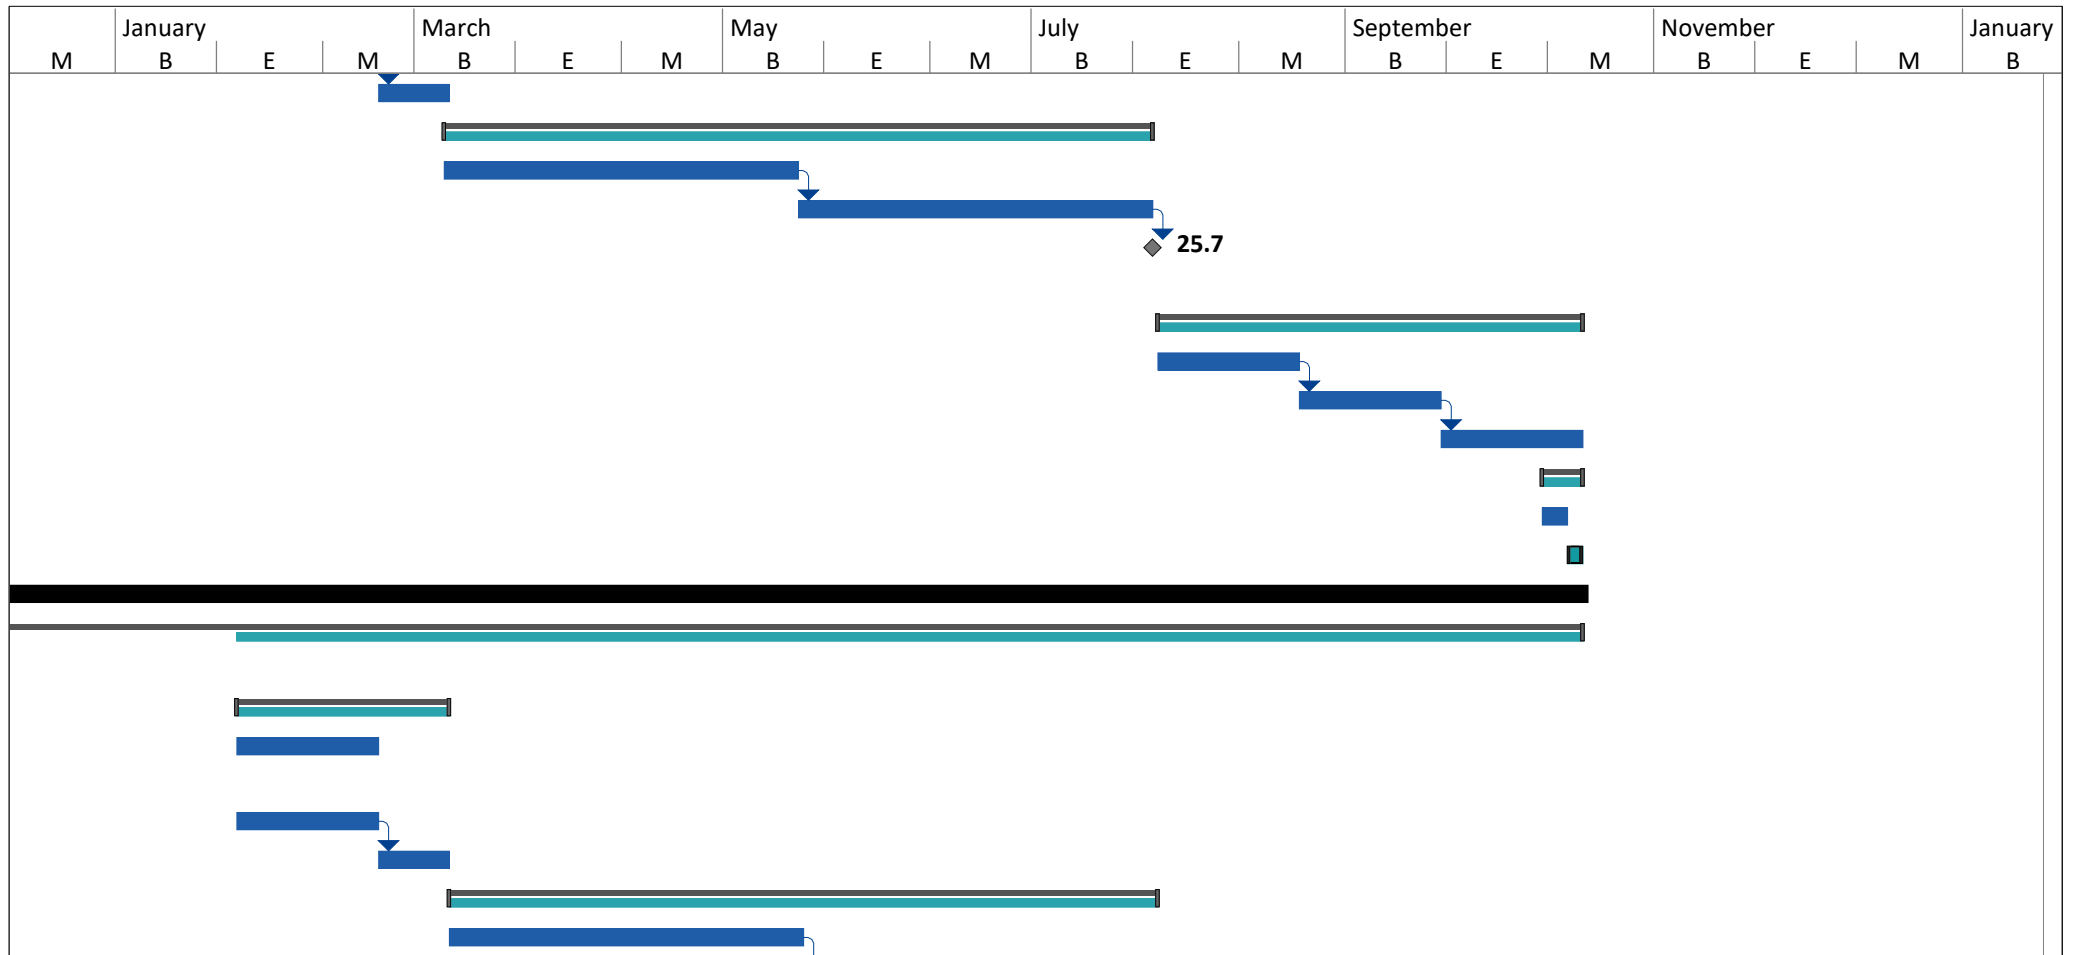


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

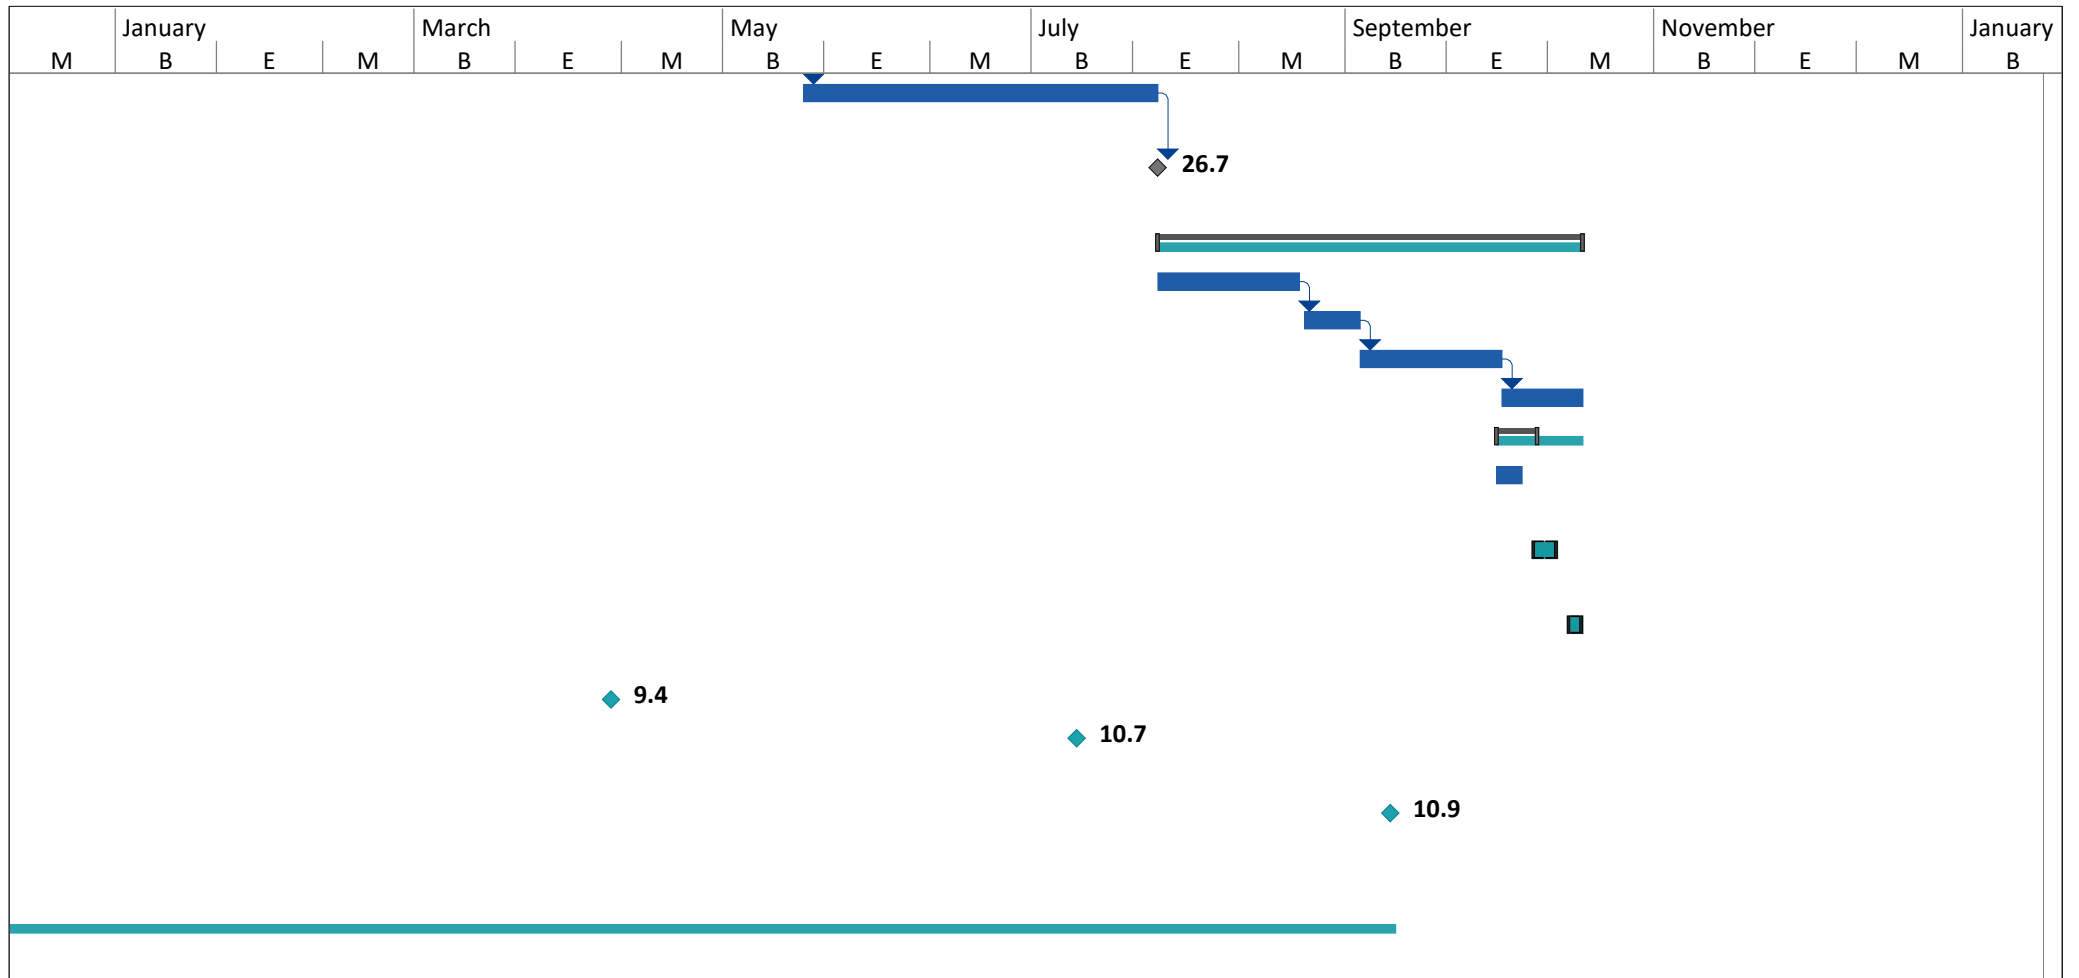


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

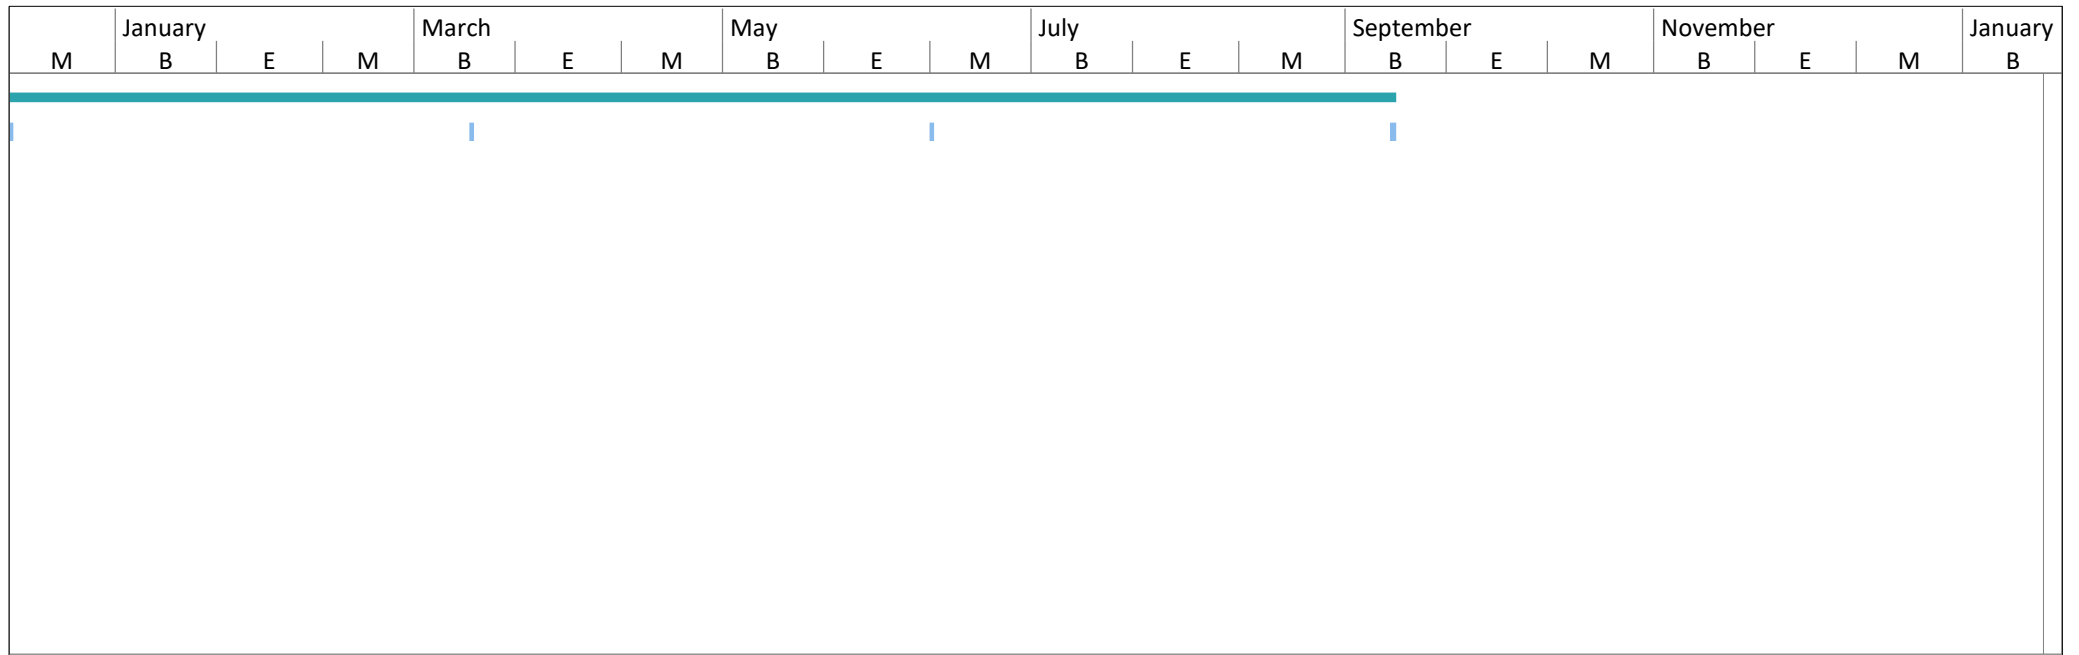


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

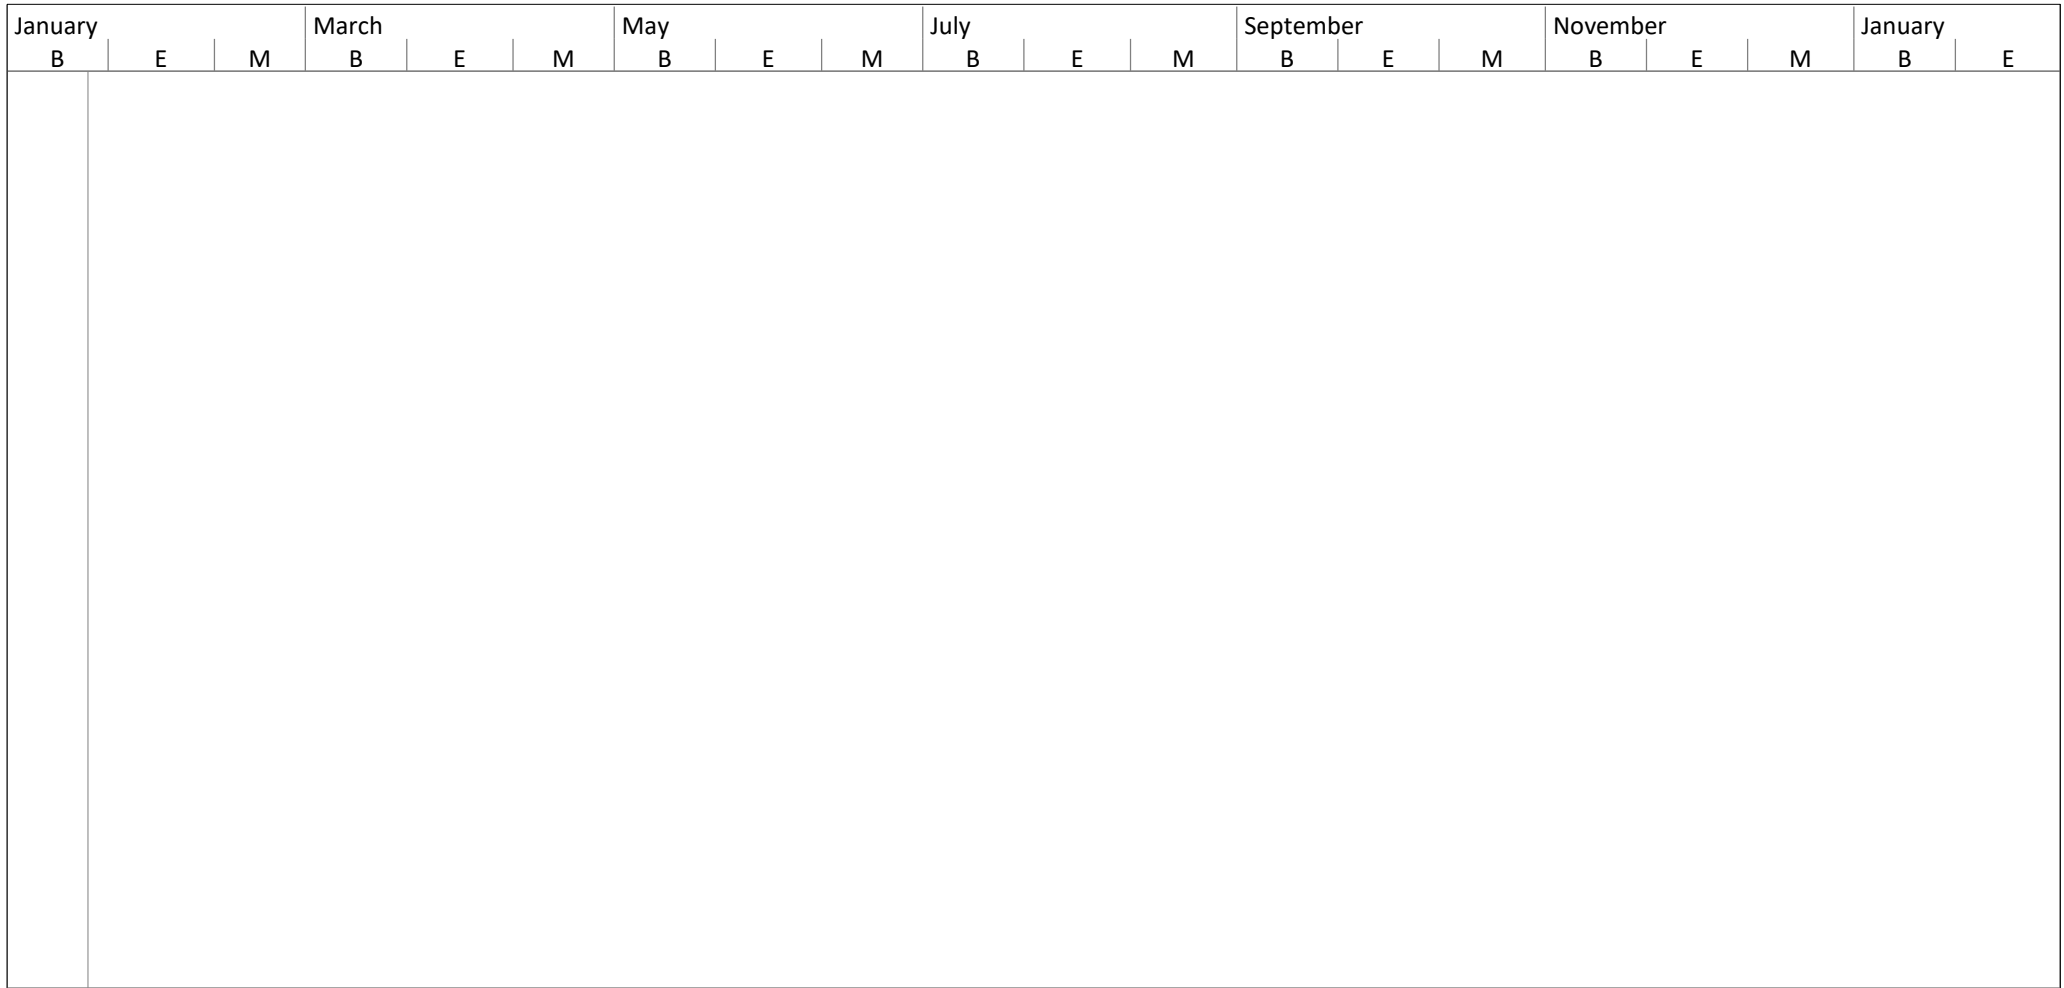


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

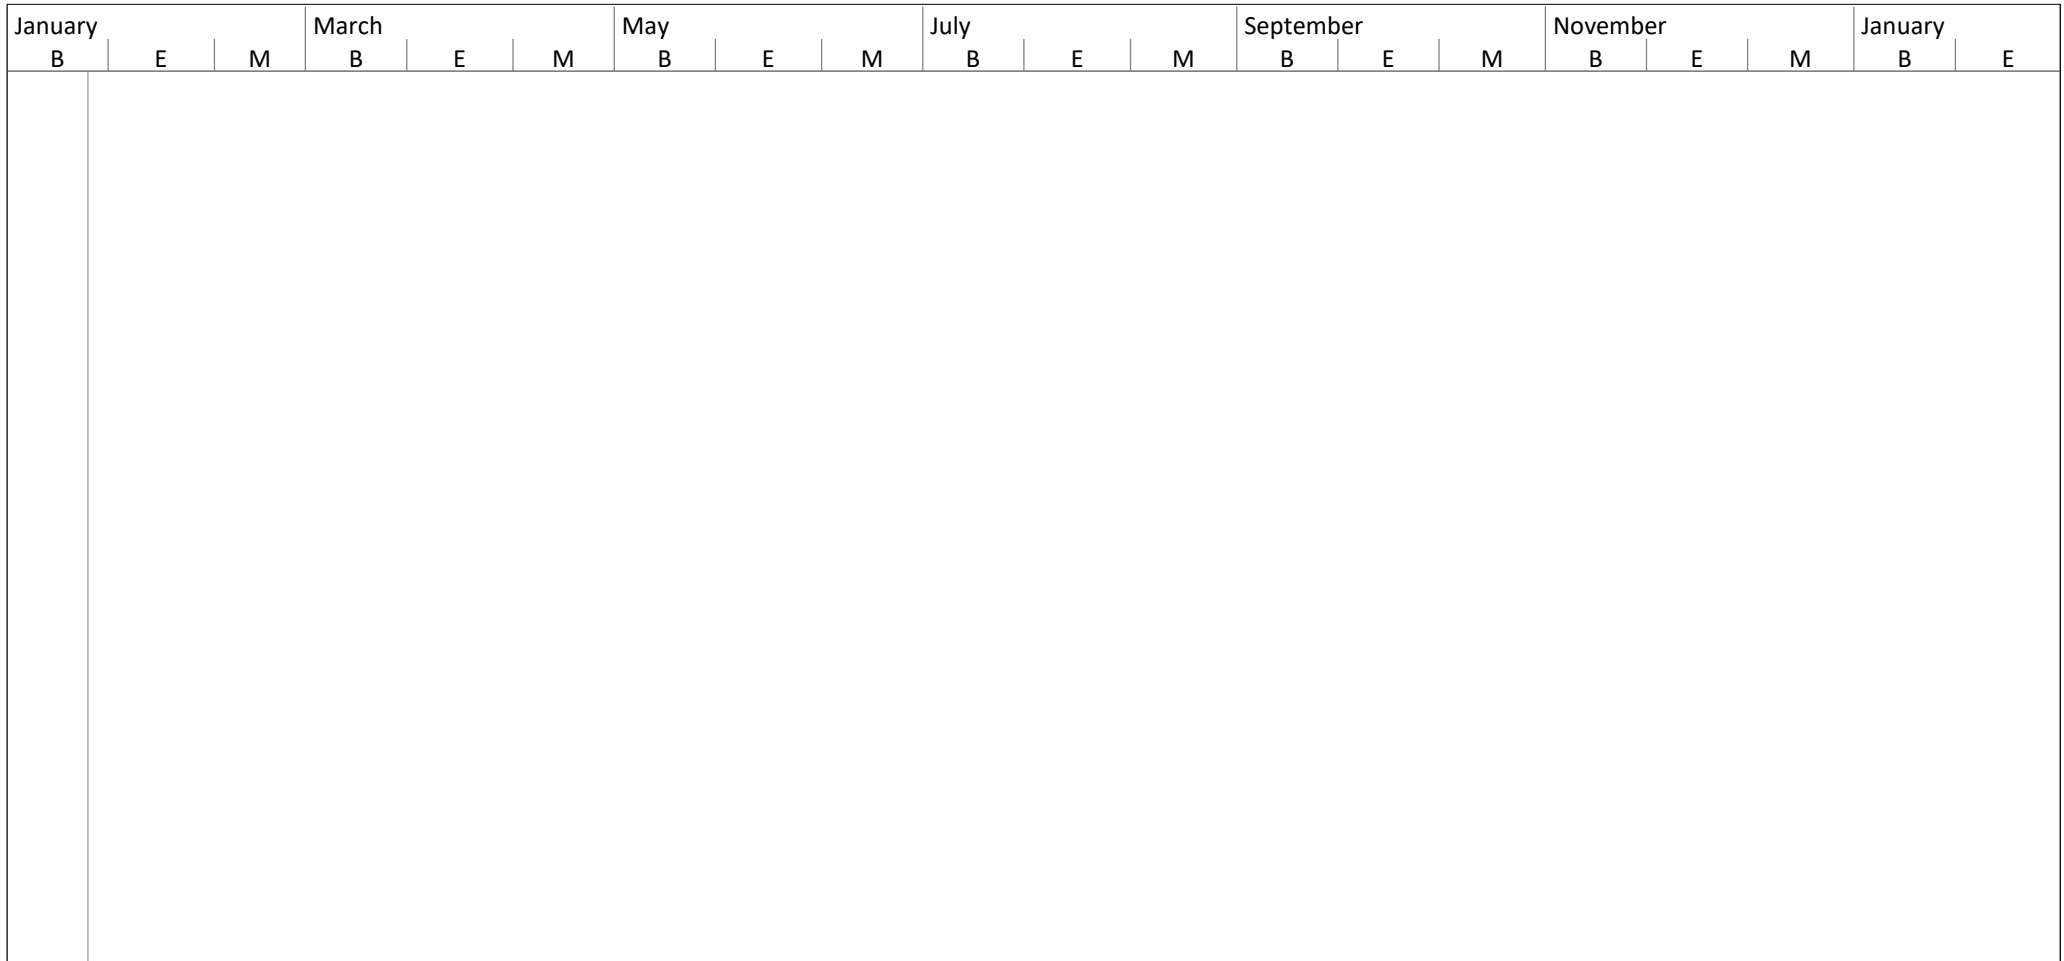

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			

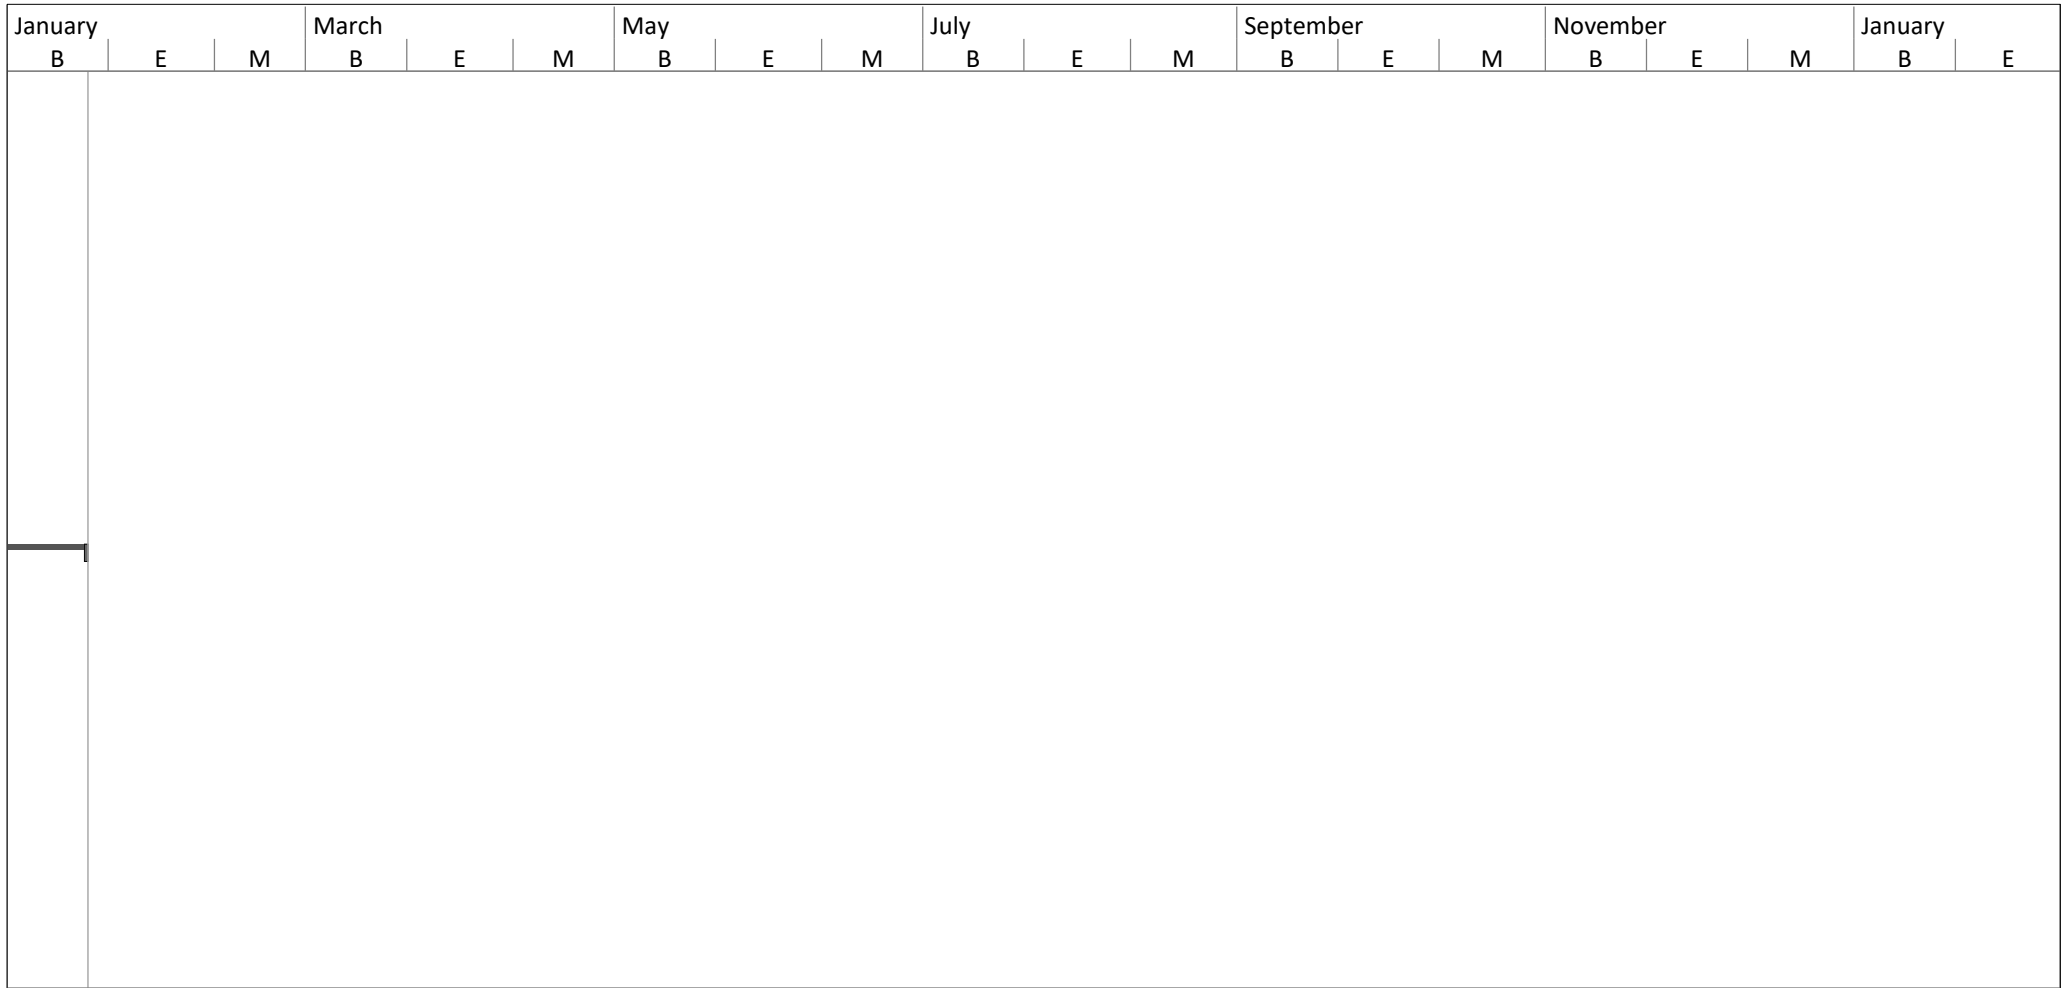


Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			




Project: 2017-10-12_Gantt Chart n
 Date: Wed 18.10.17

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Late	
Project Summary		Duration-only		Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

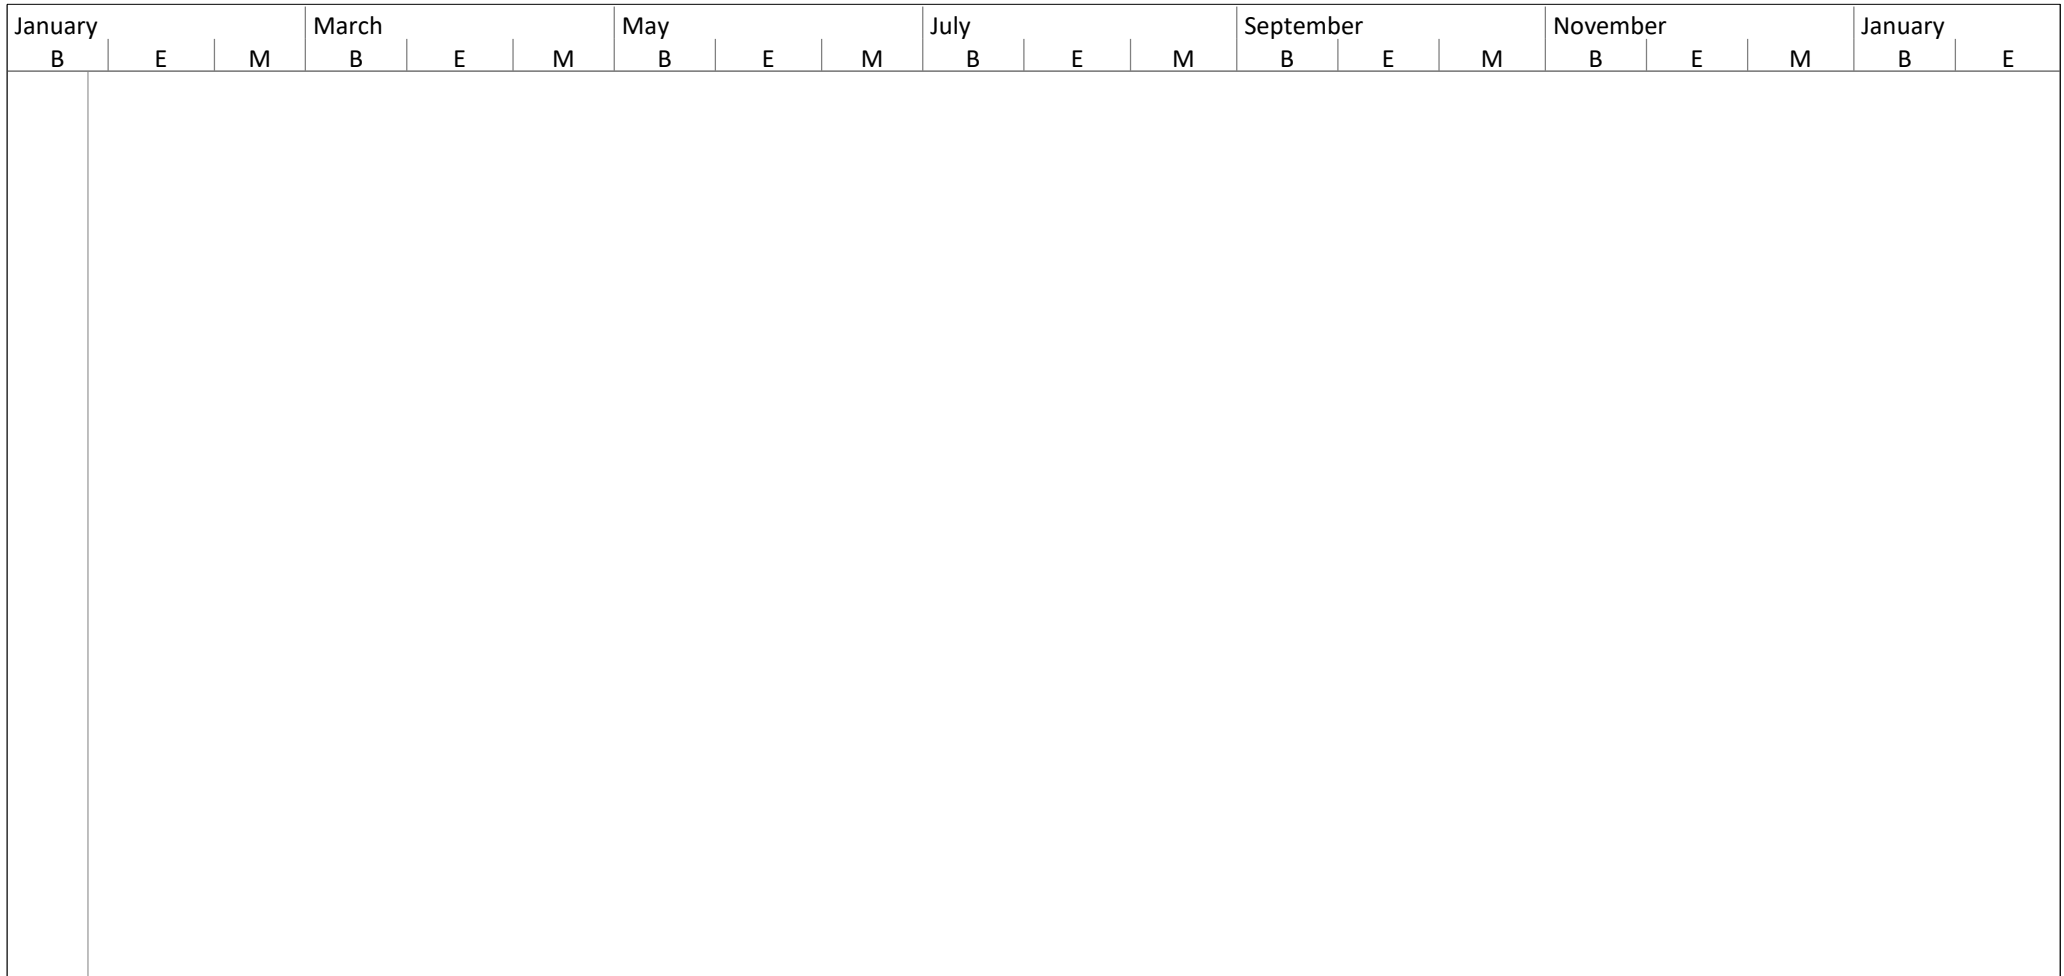

Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			



Project: 2017-10-12_Gantt Chart n Date: Wed 18.10.17	Task		Inactive Task		Start-only	
	Split		Inactive Milestone		Finish-only	
	Milestone		Inactive Summary		Deadline	
	Summary		Manual Task		Late	
	Project Summary		Duration-only		Progress	
	External Tasks		Manual Summary Rollup			
	External Milestone		Manual Summary			
